

## 5 関西大学高槻ミュージーズキャンパス

### 1 建築工事の進捗状況

#### (1) 進捗状況

	内 容
全 体	出来高 67% (10月末現在)
躯体・外装工事	1階周りを除いて完了、年内に外装工事完了予定
内装工事	校舎棟の2階から11階まで壁・天井工事完了
外構工事	11月よりグラウンド造成工事に着手

[外 観]



[コンベンションホール]



#### (2) 今後の予定

	内 容
平成22年1月～2月	工事完了・各種検査・竣工
3月	開校準備 (机等備品搬入、教職員のトレーニング)
4月	開校

### 2 施設整備補助について

○市民開放施設整備への補助 2カ年で2,400百万円を予算計上(平成20年9月議会議決)

○補助対象事業費が2,301百万円に確定 (差額99百万円は減額補正を予定)

(百万円)

		H20	H21	合 計
予算額	補助対象事業費	438.0	1,962.0	2,400.0
	国	219.0	981.0	1,200.0
	市	219.0	981.0	1,200.0
確定額	補助対象事業費	438.0	1,863.0	2,301.0
	国	219.0	931.5	1,150.5
	市	219.0	931.5	1,150.5
差 額	補助対象事業費	0	▲99.0	▲99.0
	国	0	▲49.5	▲49.5
	市	0	▲49.5	▲49.5

### 3 地・学連携について

#### (1) 地・学連携の進め方について


- 本市と関西大学とは、平成16年に地域連携に関する包括的な協定を締結しており、当該協定に基づき地・学連携に取り組んでいる。
- 今後は分野ごとに個別協定等を締結し、更なる連携を着実に継続的に進める。
- 「地域防災」、「施設開放」、「地域交流」、「高大連携」の4つの方向性に分類している具体の取組については、協定等に基づき、開始時期を短・中・長期に分けて実施するべく、関西大学との協議・調整を行っている。

分野	協定等の名称	締結日
全体	高槻市と関西大学との地域連携に関する協定書	平成16年7月14日
	覚書（高槻新キャンパスにおける地域貢献）	平成20年8月18日
	高槻市と関西大学との連携推進会議に関する協定書	平成21年2月26日
教育	関西大学と高槻市教育委員会との連携協力に関する覚書	平成16年4月30日
防災	〔災害時応援協定等〕	未締結
施設開放	覚書（アイスアリーナ）	平成18年7月7日
	〔高槻ミュージックキャンパス施設開放に関する協定〕	未締結
生涯学習	〔生涯学習に関する協定〕	未締結
図書館	〔図書館に関する協定〕	未締結

#### (2) 具体的な取組

##### ○子ども図書館

高槻市の子ども図書館については、平成21年9月16日に開催された文教市民委員会協議会で方向性を示したところである（下図参照）。そこで、当該方向性に沿って、JR高槻駅前の関西大学高槻ミュージックキャンパス内に設置される児童図書館を子ども図書館のひとつとして、また、（仮称）子ども読書支援センターのうち子ども図書館コア機能としても位置付け、市立図書館と連携を図り『まちごと「子ども図書館」』の推進を図るため、関西大学と調整中である。

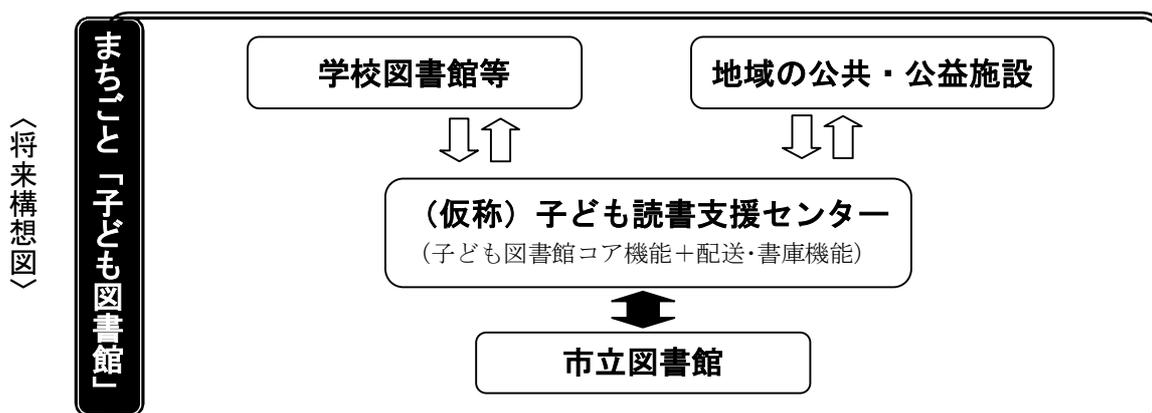

# 6 周辺道路整備

